

銀座線・東西線・半蔵門線のホームドア設置を前倒しします

お身体の不自由なおお客様のご利用等を考慮し、設置工程を前倒しします
東西線・半蔵門線では優先駅を決定しました

東京メトロ（本社：東京都台東区 社長：奥 義光）では、すべてのお客様に安心してご利用いただけるよう、ホームでの安全対策（転落事故、接触事故の防止等）として、全駅へのホームドア設置を進めていますが、この度、銀座線・東西線・半蔵門線のホームドア設置計画を見直します。

今回の見直しでは、お身体の不自由なおお客様のご利用状況やホームの状況等を考慮し、銀座線、東西線及び半蔵門線の設置工程を前倒しするとともに、東西線は6駅・半蔵門線は7駅の優先駅を選定し、2019年度末までに設置します。

東京メトロでは、引き続き一日も早く全駅にホームドアを設置できるように努めてまいります。

詳細については別紙のとおりです。

○銀座線・東西線・半蔵門線ホームドア設置計画

路線名	当初計画	見直し後の計画
銀座線	設置開始：2017年度 設置完了：2018年度 ※上野駅渋谷方面ホーム設置済 ※大規模改良工事を行っている渋谷駅・新橋駅渋谷方面ホームは工事終了時に設置予定	設置開始：2016年度末 設置完了：2018年度上期 ※上野駅渋谷方面ホーム設置済 ※大規模改良工事を行っている渋谷駅・新橋駅渋谷方面ホームは工事終了時に設置予定
東西線 (優先駅6駅)	設置開始：2017年度 設置完了：2020年度	設置開始：2017年度 設置完了：2019年度末
半蔵門線 (優先駅7駅)	設置開始：2017年度 設置完了：2020年度	設置開始：2017年度 設置完了：2019年度末

銀座線・東西線・半蔵門線ホームドア設置計画見直し概要

1 銀座線

- (1) 設置開始年度 2016 年度末
- (2) 設置完了年度 2018 年度上期(大規模改良工事を行っている渋谷駅、新橋駅渋谷方面ホーム除く)
- (3) 見直し概要

銀座線は銀座線リニューアル工事を考慮し、浅草駅から渋谷駅方向に順次設置していく計画でしたが、目の不自由なお客様の転落事故が発生した青山一丁目駅、お身体の不自由なお客様のご利用が多い外苑前駅、赤坂見附駅の設置時期を前倒すことといたします。

各駅の設置完了予定は下表のとおりです。

駅名	設置完了予定	備考
浅草～神田	2017 年 6～11 月	駅リニューアル工事に合わせて設置予定 上野駅渋谷方面ホーム設置済
青山一丁目	2017 年 12 月	当初計画より 9 ヶ月前倒し
外苑前	2017 年 12 月	当初計画より 10 ヶ月前倒し
赤坂見附	2018 年 2 月	当初計画より 5 ヶ月前倒し
上記以外の駅 ※渋谷駅、新橋駅渋谷方面ホーム除く	2018 年度上期	当初計画より 4 ヶ月前倒し

2 東西線

- (1) 設置開始年度 2017 年度
- (2) 設置完了年度 2019 年度末までに優先駅に設置完了
- (3) 見直し概要

東西線は大開口ホームドア実証実験を行っている九段下駅を最初に設置するとともに、お身体の不自由なお客様のご利用が多い駅等を考慮し、高田馬場駅、飯田橋駅、早稲田駅、神楽坂駅、竹橋駅の 6 駅を優先駅として選定いたしました。

各駅の設置完了予定は下表のとおりです。

駅名	設置完了予定
九段下	2017 年度下期
高田馬場	2018 年度
飯田橋	
早稲田	2019 年度
神楽坂	
竹橋	

3 半蔵門線

- (1) 設置開始年度 2017年度
- (2) 設置完了年度 2019年度末までに優先駅に設置完了
- (3) 見直し概要


半蔵門線は2016年4月に発生させたベビーカー引き摺り事故に鑑みまして、発生駅である九段下駅を最優先に設置するとともに、お身体の不自由なお客様のご利用が多い駅等を考慮し、青山一丁目駅、表参道駅、永田町駅、半蔵門駅、渋谷駅、押上<スカイツリー前>駅の7駅を優先駅として選定いたしました。

各駅の設置完了予定は下表のとおりです。

駅名	設置完了予定
九段下	2017年度下期
青山一丁目	2018年度
表参道	
渋谷	
永田町	2019年度
半蔵門	
押上<スカイツリー前>	

【参考】今後のホームドア設置率推移

各路線ホームドア設置計画に基づく設置率の推移は以下のとおりです。

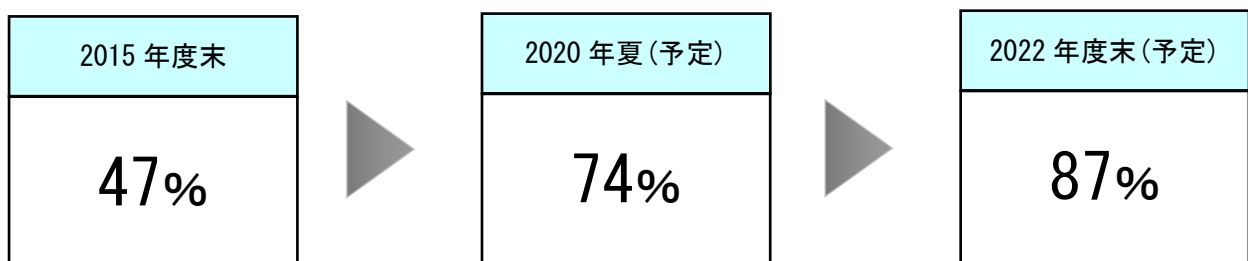

【参考】各路線ホームドア設置計画

路線名	従来計画	見直し後の計画
銀座線	設置開始：2017 年度 設置完了：2018 年度 ※上野駅渋谷方面ホーム設置済 ※大規模改良工事を行っている渋谷駅・新橋駅渋谷方面ホームは工事終了時に設置予定	設置開始：2016 年度末 設置完了：2018 年度上期 ※上野駅渋谷方面ホーム設置済 ※大規模改良工事を行っている渋谷駅・新橋駅渋谷方面ホームは工事終了時に設置予定
丸ノ内線	全駅設置済	
日比谷線	設置開始：2020 年度 設置完了：2022 年度	工程の前倒しを引き続き検討します
東西線 (優先 6 駅)	設置開始：2017 年度 設置完了：2020 年度	設置開始：2017 年度 設置完了：2019 年度末
千代田線	設置開始：2018 年度 設置完了：2020 年度 ※北綾瀬駅・綾瀬駅(北綾瀬方面行ホーム)設置済	工程の前倒しを引き続き検討します
有楽町線	全駅設置済	
半蔵門線 (優先 7 駅)	設置開始：2017 年度 設置完了：2020 年度	設置開始：2017 年度 設置完了：2019 年度末
南北線	全駅設置済	
副都心線	全駅設置済	
