

さらなる安全を追求して



—ホームドア設置計画進行中—

**有楽町線：江戸川橋駅～麴町駅間 4 駅の使用開始スケジュール決定
全 179 駅中 73 駅に整備が完了予定（設置率 40%に向上）**

東京メトロ（本社：東京都台東区 社長：梅崎 壽）では、お客様に安心してご利用いただけるよう、ホームでの安全対策（転落事故、接触事故の防止等）としてホームドアの設置を進めておりますが、この度、有楽町線全線への導入計画（平成 24 年度完成予定）のうち、江戸川橋駅～麴町駅間 4 駅の設置日と使用開始日を決定しましたのでお知らせいたします。

この 4 駅の使用開始で、東京メトロ全 179 駅中 73 駅の整備が完了し、設置率は 40%となります。引き続きホームドア設置に努めてまいります。

設置、使用開始スケジュールは別紙のとおりです。



本年 1 月 22 日から使用開始された池袋駅のホームドア

【有楽町線ホームドアの特徴】

有楽町線に設置しているホームドアは、扉部分の一部に透明な強化ガラスを採用しています。これにより、閉扉状態でもホームと列車の隙間を確認できることや、視認範囲が広がりホームでの開放感が生まれる等の効果が得られます。

さらに、曲線ホーム区間でホームと車両の隙間が大きい箇所には、可動ステップも取り付け、より一層の安全性向上に努めています。今回の使用開始区間では、江戸川橋駅の 13 か所に設置します。



可動ステップ：赤枠部分がホームドアの開閉に連動してスライドし隙間を埋める。


東京メトロでは、平成 24 年度完成を目指して、有楽町線全駅にホームドアの設置を進めています。また、次のホームドア整備路線である銀座線では、設置に向けて調査工事等を行っています。

工事期間中は、お客様に大変ご不便とご迷惑をお掛けしますが、ご理解をいただきますようお願いいたします。

Y 有楽町線路線図

 稼動中駅

 今回設置・使用開始スケジュール発表駅

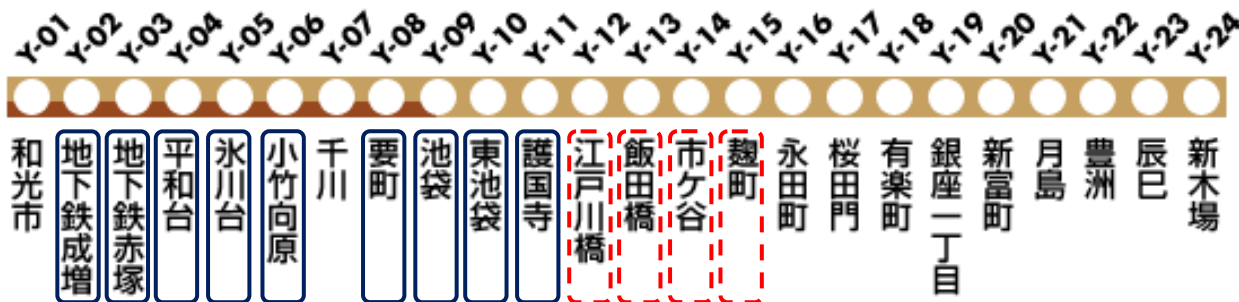

●有楽町線ホームドア設置・使用開始スケジュール（稼動中以外の駅のスケジュールは予定です）

駅名	設置日※1		使用開始日※2
	新木場方面行きホーム	和光市方面行きホーム	
Y01 和光市	設置について東武鉄道と調整中		未定
Y02 地下鉄成増	稼働中		平成22年10月16日
Y03 地下鉄赤塚	稼働中		平成22年9月25日
Y04 平和台	稼働中		平成22年9月11日
Y05 氷川台	稼働中		平成22年8月21日
Y06 小竹向原	稼働中		平成20年6月14日
Y07 千川	「連絡線設置工事」と競合するため設置時期を調整中		未定
Y08 要町	稼働中		平成23年1月8日
Y09 池袋	稼働中		平成23年1月22日
Y10 東池袋	稼働中		平成23年2月26日
Y11 護国寺	稼働中		平成23年3月26日
Y12 江戸川橋	平成23年5月14日	平成23年5月21日	平成23年8月13日
Y13 飯田橋	平成23年6月11日	平成23年6月18日	平成23年9月17日
Y14 市ヶ谷	平成23年7月9日	平成23年7月16日	平成23年10月15日
Y15 麴町	平成23年8月13日	平成23年8月20日	平成23年11月12日
Y16 永田町	平成23年度設置予定		未定
Y17 桜田門	平成23年度設置予定		未定
Y18 有楽町	平成23年度設置予定		未定
Y19 銀座一丁目	平成23年度設置予定		未定
Y20 新富町	平成23年度設置予定		未定
Y21 月島	平成23年度設置予定		未定
Y22 豊洲	「駅改良工事」と競合するため設置時期を調整中		未定
Y23 辰巳	平成24年度設置予定		未定
Y24 新木場	平成24年度設置予定		未定

※1 設置日とは、ホーム上にホームドア戸袋部分が立ち上がる時期

※2 使用開始日とは、ホームドアが開閉し始める時期

●有楽町線以外のホームドアの設置路線

N 南北線



19駅（全駅）

C 千代田線



2駅（綾瀬駅、北綾瀬駅）

M **m** 丸ノ内線



28駅（全駅）

F 副都心線



11駅（全駅）
